令和５年度

# 石狩市浄配水場運転管理等業務委託

## 運転管理業務　総合評価結果表

石狩市水道部水道施設課

# 令和５年度　石狩市浄配水場運転管理等業務委託

## 運転管理業務　総合評価

| | 評　価　項　目 | 得点（又は評価） |
|---|---|---|
| １． | 『月間業務判定評価』(50 点満点) | 45 |
| ２． | 『品質(業務内容)評価』(40 点満点) | 37 |
| ３． | 『業務改善提案評価』(加算点 10 点満点) | 5 |
| 合　　計 (100 点満点) | | 87 |
| ４． | 『総合評価』(ランク表示) | ＡＡＡ |

〔所　見〕

１．　石狩西部広域水道企業団と連携し、安定した用水（浄水）の供給を受け、配水場を適切に運転管理して安定した水道水供給を行った。当企業団の第２期創設事業に伴う諸作業等にも積極的に協力し、円滑な業務実施に寄与された。

２．　石狩市全域において、水道の水量、水質、水圧の要求水準を満たし、安定、安心の水道を実現していた。

３．　日頃からの点検・整備による施設や設備への理解と堅実な管理を実施し、天候等による異常や緊急時への危機管理意識等を十分にもつ姿勢がみられ、その対応についても適切に実施されており、高く評価できるものである。

４．　市が実施している施設更新工事等において、施設運転方法の変更、臨時の機器操作等に適切に対応し、工事の進捗、完成に寄与された。

５．　厚田区、浜益区において、夜間水量の監視や漏水調査の補助業務により、漏水の早期発見と大きな漏水発生の防止に努め、かつ漏水事故の際は緊急対応など積極的かつ適切に市の職員との連携を図られた。

６．　冬季間における施設の維持管理（水源地におけるスノージャム対策、除排雪）を適切に実施していた。厚田取水施設の冬季運用について初年度の管理経験を踏まえた管理手法を提案し、安定した施設運用を実現された。

７．　施設の着水井、沈澱池、ろ過池、配水池等の清掃を適切に実施し、施設の清潔な管理に努められた。

８．　巡回経路や休止施設の点検時の危険箇所等を早期に解消し、安全確保に努められた。

９．　日頃より給水タンク車や給水袋等の緊急資機材の管理を行い、有事の際には直ちに対応できる体制を構築された。

１０．　地域の清掃活動への参加や施設点検時の自主的な清掃活動、市内イベント時の給水等対応を通じ、地域貢献への姿勢は高く評価できるものである。

１１．　市との連絡、連携体制は良好であり、安定・安全・安心な水道という共通目標に向けて協働する姿勢は高く評価できるものである。

別紙 1

# 令　和　５　年　度

## 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　運転管理業務評価要領

## 『月間業務判定評価』　結果表

月間業務評価結果

| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 45.0 | 45.7 | 44.7 | 44.0 | 43.7 |

| １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 45.3 | 44.3 | 44.3 | 44.7 | 45.3 | 44.6 |

| 総合評価点　『月間業務判定評価』 | 45点<br>（50点満点） |
|---|---|

※小数点以下は四捨五入とする。

【判定項目と内容】

| | |
|---|---|
| 運転監視業務 | 監視室業務全般、日報等整理、物品管理、防犯などに関すること |
| 電気及び機械の保全業務 | 設備・計装等の定期点検、法定点検などに関すること |
| 巡回監視業務 | 施設等の運転、日常点検、清掃、薬品管理などに関すること |
| 水質管理業務 | 水質検査(法定・独自・臨時)、凝集試験などに関すること |
| 修繕・改修業務 | 更新工事等の立会いや修繕業務全般に関すること |
| 調達業務 | 薬品や燃料、通信、物品等の調達、資料整理に関すること |
| 維持管理業務 | 弁室、水管橋、配水池、取水施設等の点検や清掃等に関すること |
| 受配水量管理業務 | 依頼文書作成、連絡、水位など監視室との連携等に関すること |
| 緊急時対応 | 緊急時初期対応、異常対応、災害時の応急給水等に関すること |
| その他業務 | 除雪、除草、車両管理、事務全般、その他上記以外のもの |

# 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

| | |
|---|---|
| 評価点　優 | 5 |
| 評価点　良 | 4 |
| 評価点　可 | 3 |
| 評価点　不可 | 0 |

月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員の3名で行い、評価結果の表示は、その3名をランダムに監督員A、B、Cに置き換える。

| | 4月 | | | | | | 5月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 3. 巡回監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 4. 水質管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 9. 緊急時対応 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 合計 | | 43 (A) | | 42 (B) | | 46 (C) | | 44 (A) | | 45 (B) | | 46 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 43.7 | 45.0 |

| | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 3. 巡回監視業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 4. 水質管理業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 9. 緊急時対応 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 合計 | | 44 (A) | | 46 (B) | | 47 (C) | | 44 (A) | | 44 (B) | | 46 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 45.7 | 44.7 |

# 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

| | |
|---|---|
| 評価点　優 | 5 |
| 評価点　良 | 4 |
| 評価点　可 | 3 |
| 評価点　不可 | 0 |

月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員の3名で行い、評価結果の表示は、その3名をランダムに監督員A、B、Cに置き換える。

| | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 3. 巡回監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 4. 水質管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 9. 緊急時対応 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 合計 | | 44 (A) | | 42 (B) | | 46 (C) | | 44 (A) | | 42 (B) | | 45 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 44.0 | 43.7 |

| | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 3. 巡回監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 4. 水質管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 9. 緊急時対応 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 合計 | | 44 (A) | | 43 (B) | | 45 (C) | | 44 (A) | | 45 (B) | | 47 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 44.0 | 45.3 |

# 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　月間業務評価　取りまとめ表

| | |
|---|---|
| 評価点　優 | 5 |
| 評価点　良 | 4 |
| 評価点　可 | 3 |
| 評価点　不可 | 0 |

月間業務の評価は、水道施設課長、担当主査、担当係員の3名で行い、評価結果の表示は、その3名をランダムに監督員A、B、Cに置き換える。

| | 12月 | | | | | | 1月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 3. 巡回監視業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 4. 水質管理業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 9. 緊急時対応 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 合計 | | 44 (A) | | 44 (B) | | 45 (C) | | 44 (A) | | 44 (B) | | 45 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 44.3 | 44.3 |

| | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | | 監督員A | | 監督員B | | 監督員C | |
| | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 |
| 1. 運転監視業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 2. 電気及び機械の保全業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 3. 巡回監視業務 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 4. 水質管理業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 |
| 5. 修繕・改修業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 良 | 4 | 優 | 5 |
| 6. 調達業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 7. 維持管理業務 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 8. 受配水量管理業務 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 良 | 4 |
| 9. 緊急時対応 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 10. その他業務 | 良 | 4 | 優 | 5 | 良 | 4 | 良 | 4 | 優 | 5 | 優 | 5 |
| 合計 | | 43 (A) | | 45 (B) | | 46 (C) | | 45 (A) | | 46 (B) | | 45 (C) |

| | | |
|---|---|---|
| 月間業務　評価点<br>＝((A)＋(B)＋(C))÷3 | 44.7 | 45.3 |

別紙－２

# 令　和　　５　　年　度

## 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　運転管理業務評価要領

## 『品質(業務内容)評価』　結果表

| | |
|---|---|
| 業　務　評　価　指　標　項　目　数 | 57 |
| 『品質(業務内容)評価』得点合計※1 | 372　／　400 |

| | |
|---|---|
| 総合評価点『品質(業務内容)評価』 | 37点<br>(40点満点) |

注）換算係数10で除して、40点満点としたものを総合評価点『品質(業務内容)評価』とする。

小数点以下は四捨五入。

別紙2

| No. | 大分類/中分類/小分類/独自項目 | 評価指標 | 評価内容 | 指標の定義等 | a | b | c | d | e | 評価結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEI- 1 01 01 | 契約図書等に基づく書類の提出 | 年間業務計画、月間業務計画、年間業務報告、月間業務報告、従事者の届出の提出状況と内容について評価する。 | 定めた期限に対する経過日数(日) | 5点<br>全て期限内に提出され、内容も適切に作成されている。 | 4点<br>全て期限内に提出されているが、内容に不備があり委託者の指示を必要とした。 | 3点<br>全て提出(一部の書類は最長で7営業日以内の期限超過)。 | 2点<br>全て提出(一部の書類は最長で8営業日超えの期限超過)。 | 1点<br>全て提出(多くの書類が期限超過)。 | b | 4点 |
| 2 | CEI- 1 02 01 | 関係法令等の遵守状況 | 水道法、労働安全衛生法、消防法、電気事業法、廃掃法、フロン法、個人情報保護法、道路交通法の遵守状況について評価する。 | 違反なし項目数/評価対象項目数)×100(%)※適合率 | 10点<br>違反が全くない。(適合率100%) | 8点<br>受託者の責で速やかに是正措置が取られた軽微な違反がある。(適合率90%以上) | 6点<br>受託者の責で速やかに是正措置が取られた軽微な違反がある。(適合率90%未満)または他の評価に該当しない軽易なものがあった。 | 4点<br>関係機関より軽微な改善指導などを受ける事象が発生した。 | 0点<br>関係法令及び規則等に対する重大な違反があった。 | a | 10点 |
| 3 | CEI- 1 02 02 | 施設設備等の法令点検状況 | 自家用電気工作物保安管理点検および消防設備点検について履行状況評価する。 | 法令点検実施数/法令点検実施対象項目数×100(%)※実施率 | 5点<br>実施率100%かつ、点検の内容、結果報告に不備がなかった。 | 4点<br>実施率100%であったが、点検記録に不備があった。 | 3点<br>実施率100%であったが、点検の実施内容に不備があり、是正し改善された。 | 2点<br>実施率100%であったが、点検の実施内容に不備があり、改善されなかった。 | 0点<br>実施率が100%未満、もしくは法令等に違反する点検を行った(無資格者による点検等)。 | a | 5点 |
| 4 | CEI- 1 03 01 | 緊急連絡体制表の作成状況 | 緊急連絡体制表の適切な掲示、水質異常、設備異常、停電、通信異常、漏水、防犯警備の連絡体制(連絡先等や掲示状況)について評価する。 | 該当項目数/評価対象項目×100(%)※適合率 | 5点<br>適合率100% | 4点<br>適合率90%以上100%未満 | 3点<br>適合率80%以上90%未満 | 2点<br>適合率80%未満 | 0点<br>適合率80%未満かつ、指定した初回提出期限、もしくは再提出期限までに提出しなかった。 | b | 4点 |
| 5 | CEI- 1 04 01 | 要求水準の適合状況 | 要求水準のうち施設出口の残留塩素、配水水圧、受水量の達成状況を評価する。※取水量はCEI-20101と重複除外 | 適合項目数/評価対象項目×100(%)※適合率 | 15点<br>要求水準の適合状況100% | 12点<br>要求水準の適合状況98%以上100%未満 | 9点<br>要求水準の適合状況96%以上98%未満 | 6点<br>要求水準の適合状況95%以上96%未満 | 4点<br>要求水準の適合状況95%未満 | a | 15点 |
| 6 | CEI- 1 05 01 S | 適切な苦情対応率 | 苦情内容の確認、記録および関係部署への連絡や必要な措置を評価する。 | 苦情対応件数/苦情件数×100(%)※委託者が受けた受託者に関連する対応を含む。 | 5点<br>苦情対応率100%であり、適切な対応であった。 | | 3点<br>苦情対応率100%であるが、やや不適切な対応があった。または対応すべき苦情がなかった。 | | 0点<br>苦情対応率100%であるが、不適切な対応であった。または苦情対応率100%未満 | c | 3点 |
| 7 | CEI- 1 07 01 | 労務災害発生件数 | 発生件数から受託者の職員管理、指導及びその体制の有効性を労災発生件数から評価する。 | 委託者への労務災害報告数(件)※不可抗力によるものは除く | 10点<br>労務災害発生件数0件 | 8点<br>労務災害発生件数軽微な労務災害(休業なし)1件 | 6点<br>労務災害発生件数軽微な労務災害(休業4日未満)1件 | 4点<br>労務災害発生件数(休業4日以上)1件 | 0点<br>労務災害発生件数(休業4日以上)2件以上 | c | 6点 |
| 8 | CEI- 1 07 02 | 安全衛生パトロールの実施率 | 安全衛生パトロールの実施状況(実施率)より安全意識の向上と取組み姿勢を評価する。 | 実施回数/年間計画数×100(%) | 5点<br>安全衛生パトロール実施率100% | 4点<br>安全衛生パトロール実施率90%以上100%未満 | 3点<br>安全衛生パトロール実施率80%以上90%未満 | 2点<br>安全衛生パトロール実施率70%以上80%未満 | 1点<br>安全衛生パトロール実施率70%未満 | a | 5点 |
| 9 | CEI- 1 07 03 | 緊急時の対応率 | 緊急時の適切な対応率からリスクマネジメントの技量を評価する。 | 対応件数/緊急時の発生件数(%)※対応件数は迅速に対応し、被害を最小限とできたもの | 10点<br>緊急時の対応率100% | 8点<br>緊急時の対応率90%以上100%未満 | 6点<br>緊急時の対応率80%以上90%未満 | 4点<br>緊急時の対応率70%以上80%未満 | 0点<br>緊急時の対応率70%未満もしくは、未対応事案があった。 | a | 10点 |
| 10 | CEI- 1 07 04 S | 緊急時の要員確保 | 最寄りの対象施設への20分圏内在住率により参集体制を評価する。 | 20分圏内在住者数/受託従事者数×100(%) | 5点<br>緊急時の要員確保率100% | 4点<br>緊急時の要員確保率90%以上100%未満 | 3点<br>緊急時の要員確保率80%以上90%未満 | 2点<br>緊急時の要員確保率70%以上80%未満 | 1点<br>緊急時の要員確保率70%未満 | b | 4点 |
| 11 | CEI- 1 07 05 | 安全衛生に関する活動 | 従事者の労務災害の発生防止を図る取組み状況(実施率)を評価する。 | 安全衛生に関する活動数/実施予定数×100(%) | 5点<br>安全衛生に関する活動状況100% | 4点<br>安全衛生に関する活動状況90%以上100%未満 | 3点<br>安全衛生に関する活動状況80%以上90%未満 | 2点<br>安全衛生に関する活動状況70%以上80%未満 | 1点<br>安全衛生に関する活動状況70%未満 | a | 5点 |
| 12 | CEI- 1 07 07 S | 保護具・安全器具の整備状況 | 保護具(ヘルメット、靴、安全帯）および酸欠ガス測定器の点検率から安全に対する意識を評価する。 | 点検実施回数/点検計画数×100(%) | 5点<br>実施率100% | 4点<br>実施率90%以上100%未満 | 3点<br>実施率80%以上90%未満 | 2点<br>実施率70%以上80%未満 | 1点<br>実施率70%未満 | a | 5点 |

| No. | 大分類/中分類/小分類/独自項目 | 評価指標 | 評価内容 | 指標の定義等 | a | b | c | d | e | 評価結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CEI- 1 08 01 S | 資格取得率 | 契約図書や履行計画で定めたもののほか有益となる資格取得状況(取得率)を評価する。 | (資格項目数×保有者数)/(資格項目数×1)×100(%) | 5点<br>資格取得率120%以上 | 4点<br>資格取得率110%以上 | 3点<br>資格取得率100%以上 | 2点<br>資格取得率90%以上 | 1点<br>資格取得率80%以下 | a | 5点 |
| 14 | CEI- 1 08 02 | マニュアル作成率 | 新規作成および改定の計画状況とその実施状況(作成率、改定率)から取組みの姿勢を評価する。 | (新規作成数+改定作成数)/(計画新規作成数+計画改定作成数)×100(%)※計画には委託者が要求したものを含む。 | 5点<br>マニュアル作成率100% | 4点<br>マニュアル作成率90%以上100%未満 | 3点<br>マニュアル作成率80%以上90%未満 | 2点<br>マニュアル作成率80%未満 | 0点<br>マニュアル作成率80%未満かつ、委託者が作成を文書で指示しても作成しなかった。 | a | 5点 |
| 15 | CEI- 1 08 04 S | 研修・訓練等の協働実施率 | 危機管理訓練・研修(情報伝達、給水車訓練等実務)の実施状況について評価する。 | 年間に実施した訓練及び研修の回数(回)※委託者の都合や不可抗力による中止は除く。 | 5点<br>2回以上 | | 3点<br>1回 | | 1点<br>実施しなかった。 | a | 5点 |
| 16 | CEI- 1 08 05 | 研修の実施率 | 受託者が計画した技術向上の研修の実施状況(実施率)から、モチベーションやスキル向上の姿勢を評価する。 | 実施回数/計画回数×100(%) | 5点<br>研修の実施率100% | 4点<br>研修の実施率90%以上100%未満 | 3点<br>研修の実施率80%以上90%未満 | 2点<br>研修の実施率70%以上80%未満 | 1点<br>研修の実施率70%未満 | a | 5点 |
| 17 | CEI- 1 09 01 S | 責任者の常駐 | 開庁日の責任者常駐状況から、業務の責任達成度を評価する。 | 常駐日数/開庁日×100(%)※責任者は総括責任者もしくは副総括責任者とする。 | 5点<br>責任者の常駐100% | 4点 | 3点<br>責任者の常駐95%以上100%未満 | 2点 | 1点<br>責任者の常駐95%未満 | a | 5点 |
| 18 | CEI- 1 09 04 S | 企業組織内支援体制確立状況 | 企業組織内支援体制について確立状況を評価する。 | 企業組織内支援体制確立状況 | 5点<br>企業内での支援体制が確立されており、その具体的な内容について委託者に計画として提出している。 | | 3点<br>企業内での支援体制があるが、委託者に具体的な計画としての提出にまでは至っていない。 | | 0点<br>企業内での支援体制が整備されていない。 | a | 5点 |
| 19 | CEI- 1 09 05 S | 業務必要人員の確保状況 | 開庁日における計画で定めた最低必要人員(石狩地区2名、厚浜地区3名)の確保状況から組織体制の安定状況について評価する。 | 年間の最低必要人員を欠いた日数(日) | 5点<br>最低必要人員を欠いた日数0日 | 4点<br>最低必要人員を欠いた日数1日 | 3点<br>最低必要人員を欠いた日数2～3日 | 2点<br>最低必要人員を欠いた日数4～5日 | 1点<br>最低必要人員を欠いた日数6日以上 | a | 5点 |
| 20 | CEI- 1 10 02 S | 地域への貢献度 | 地元企業での調達、清掃活動や防犯活動、イベント協賛などから地域社会や住民に対する貢献度、社会性を評価する。 | 年間の地域活動・イベント参加回数(回)※同内容で定期的に実施しているものは1回としてカウントする。 | 10点<br>地域への貢献活動回数4回以上 | 8点<br>地域への貢献活動回数3回 | 6点<br>地域への貢献活動回数2回 | 4点<br>地域への貢献活動回数1回 | 0点<br>地域への貢献活動がなかった。 | a | 10点 |
| 21 | CEI- 1 10 03 | 環境配慮項目数 | 定期的な清掃等の職場環境に関すること、省エネや再資源化にかかる取組みなどの項目数から評価する。 | 環境配慮項目数(項目)※項目は受託者ヒアリングによる取組みを委託者が精査したものとする。 | 5点<br>環境配慮項目数6項目以上 | 4点<br>環境配慮項目数5項目 | 3点<br>環境配慮項目数4項目 | 2点<br>環境配慮項目数3項目 | 1点<br>環境配慮項目数2項目以下 | d | 2点 |
| 22 | CEI- 1 10 04 S | 企画提案の取組み(設備振動測定、バッテリー診断) | 対象施設に対する実施率から、履行状況や業務向上への姿勢を評価する。 | 実施数/対象施設数×100(%) | 10点<br>実施率100% | 8点<br>実施率90%以上100%未満 | 6点<br>実施率80%以上90%未満 | 4点<br>実施率70%以上80%未満 | 2点<br>実施率70%未満 | a | 10点 |
| 23 | CEI- 1 10 05 S | 企画提案の取組み(環境測定) | 新港中央配水場、花川北配水場での年1回の実施率から、履行状況や業務向上への姿勢を評価する。 | 実施数/計画施設数2か所×100(%) | 10点<br>実施率100% | | 6点<br>実施率50% | | 0点<br>実施できなかった | a | 10点 |
| 24 | CEI- 2 01 01 | 取水不適切率 | 取水不足日数と水利権95%以上の取水超過日数より不適合率を求め、計画的な安定取水について評価する。 | (取水不足日数+取水超過日数)/1年間あたり日数×100(%)※受託者の責でない事故、故障、点検等によるものは除く。 | 5点<br>取水不適合率2%未満 | 4点<br>取水不適合率2%以上4%未満 | 3点<br>取水不適合率4%以上6%未満 | 2点<br>取水不適合率6%以上8%未満 | 1点<br>取水不適合率8%以上 | a | 5点 |

| No. | 大分類/中分類/小分類/独自項目 | 評価指標 | 評価内容 | 指標の定義等 | a | b | c | d | e | 評価結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CEI- 2 01 02 S | 飲用制限日数 | 受託者の責により飲用禁止や煮沸条件等の制限設けて給水した時間帯を含む日数から、運転及び維持管理能力を評価する。 | 年間で飲用制限を行った日数(日) | 10点<br>飲用制限日数0日 | | | | 0点<br>飲用制限日数1日以上 | a | 10点 |
| 26 | CEI- 2 01 04 | 配水池の適正運用 | 受託者の責による適正水位(配水池維持管理水位)逸脱回数から運転管理にかかる適正な運用を評価する。 | 年間あたりの適正水位逸脱回数(回)※施設点検など意図的に行ったもの、停電や災害など不可抗力は除く | 5点<br>配水池の適正水位逸脱回数0回 | 4点<br>配水池の適正水位逸脱回数1回 | 3点<br>配水池の適正水位逸脱回数2回 | 2点<br>配水池の適正水位逸脱回数3回 | 1点<br>配水池の適正水位逸脱回数4回以上 | a | 5点 |
| 27 | CEI- 2 01 05 | 運転管理に係わる事故件数 | 運転管理に係わる事故の重大度と件数から運転管理にかかる監視および操作の適格性を評価する。 | 年間あたりの重大度ごとの事故件数(件)※施設の誤操作、状態変化の見過ごし、ジャーテストの未実施による凝集不良など | 10点<br>事故がなく適正な運転管理がされていた。 | 8点<br>軽微な事故(事故の発生があったが適正な是正措置がとられ、支障が生じない事象)が1件あった。 | 6点<br>軽微な事故が2件あった。 | 4点<br>軽微な事故が3件以上かつ、やや不適切な事故(事故の発生があり軽微な支障が生じた事象)が1件あった。 | 0点<br>軽微な事故4件以上またはやや不適切な事故2件以上、不適切な事故(運転停止、給水支障等が生じた事象)が1件以上あった。 | a | 10点 |
| 28 | CEI- 2 01 07 | 連絡の不備及び遅延による支障 | 連絡の不備等による業務支障回数から従事者の施設理解度、習熟度や業務規律の徹底度を評価する。 | 業務に支障が生じた回数(回) | 5点<br>連絡の不備および遅延による支障0回 | | 3点<br>連絡の不備および遅延による支障1回 | | 0点<br>連絡の不備および遅延による支障2回以上(ただし危機事象が発生した場合は1回でもe評価) | a | 5点 |
| 29 | CEI- 2 01 09 S | その他関連業務(除草・除雪業務) | 受託者の責に起因する除草や除雪に関する苦情相談等の発生件数から適切な履行状況について評価する。 | 苦情相談等の発生件数(件)※委託者からの指摘事項も含める | 5点<br>苦情相談等がなかった | 4点<br>苦情相談等の発生1件 | 3点<br>苦情相談等の発生2件 | 2点<br>苦情相談等の発生3件 | 0点<br>苦情相談等の発生4件以上 | a | 5点 |
| 30 | CEI- 2 01 10 S | その他関連業務(機械警備業務) | 受託者の設定不備による警備会社の対応回数から管理意識について評価する。 | 設定不備回数(回) | 5点<br>設定不備がなかった | 4点<br>設定不備1回 | 3点<br>設定不備2回 | 2点<br>設定不備3回 | 0点<br>設定不備4回以上 | e | 0点 |
| 31 | CEI- 2 01 11 S | その他関連業務(給水車管理業務) | 受託者の管理不備による、給水車の出動に支障があった件数から、管理の適切な履行状況を評価する。 | 管理不備による出動支障件数(件) | 5点<br>適切に管理がなされ、出動に支障がなかった | 4点 | 3点<br>出動支障件数1件、軽易なものであり即時に対応可能なものであった | 2点 | 0点<br>出動支障件数1件、重大なものでありその対応に長時間を要するものであった | a | 5点 |
| 32 | CEI- 2 02 01 | 通信不能 | 受託者の責により通信不能となり長期にわたるデータ欠損や監視制御に支障が生じた回数から従事者への教育、マニュアルの徹底など保全管理健全度を評価する。 | 通信不能回数(回)※長期にわたるデータ欠損や監視制御に支障が生じた回数 | 5点<br>通信不能0回 | | 3点<br>通信不能3回以内 | | 0点<br>通信不能4回以上 | a | 5点 |
| 33 | CEI- 2 02 02 S | 燃料備蓄不足 | 燃料備蓄不足による点検作業や停電時への支障件数から、危機管理意識を評価する。 | 燃料備蓄不足による支障件数(件) | 5点<br>燃料備蓄不足0件 | | 3点<br>燃料備蓄不足により点検作業への支障など軽微な事象が生じた。 | | 0点<br>燃料備蓄不足により停電時の支障など重大な事象が生じた。 | a | 5点 |
| 34 | CEI- 2 02 03 S | 保全管理に係わる事故件数 | 保全管理に係わる事故の重大度と件数から保全管理にかかる設備知識と設備保全の適格性を評価する。 | 年間あたりの重大度ごとの事故件数(件)※施設設備等の点検、調整、修繕、校正、清掃等の不適により起因する事故 | 10点<br>保全管理に係わる事故件数0件 | 8点<br>軽度な事故(重度以外のもの)が1件 | 6点<br>軽度な事故(重度以外のもの)が2件以上 | 4点<br>軽度な事故(重度以外のもの)が3件以上 | 0点<br>重度な事故(水質、給水に影響を及ぼすもの)が1件以上 | a | 10点 |
| 35 | CEI- 2 02 05 | 日常点検実施率 | 計画に対する日常点検実施率より維持管理の適正度を評価する。 | 日常点検の実施数/日常点検の計画数×100(%) | 10点<br>日常点検実施率100% | 8点<br>日常点検実施率90%以上100%未満 | 6点<br>日常点検実施率85%以上90%未満 | 4点<br>日常点検実施率80%以上85%未満 | 2点<br>日常点検実施率70%未満 | a | 10点 |
| 36 | CEI- 2 02 06 | 定期点検実施率 | 計画に対する定期点検実施率より維持管理の適正度を評価する。 | 定期点検の実施数/定期点検の計画数×100(%)※外注の点検も含む | 10点<br>定期点検実施率100% | 8点<br>定期点検実施率85%以上100%未満 | 6点<br>定期点検実施率80%以上85%未満 | 4点<br>定期点検実施率75%以上80%未満 | 2点<br>定期点検実施率75%未満 | a | 10点 |

| No. | 大分類/中分類/小分類/独自項目 | 評価指標 | 評価内容 | 指標の定義等 | a | b | c | d | e | 評価結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CEI- 2 02 08 S | 小規模修繕実施率 | 修繕等業務費の執行率を修繕実施の目安として実施状況を評価する。 | 当該年度支出額/当該年度予算額×100(%) | 5点<br>執行率95%以上100% | 4点<br>執行率90%以上95%未満 | 3点<br>執行率85%以上90%未満 | 2点<br>執行率80%以上85%未満 | 1点<br>執行率80%未満 | b | 4点 |
| 38 | CEI- 2 02 10 | 見学者対応率 | 見学者対応率から貢献度を評価する。 | 対応件数/依頼件数×100(%) | 5点<br>見学者対応率100% | 4点<br>見学者対応率90%以上100%未満 | 3点<br>見学者対応率80%以上90%未満 | 2点<br>見学者対応率70%以上80%未満 | 1点<br>見学者対応率70%未満 | a | 5点 |
| 39 | CEI- 2 02 11 S | 施設台帳作成状況 | 施設台帳作成状況を評価する。 | 未完の作成件数(件)※更新も含む | 5点<br>作成未完件数0件 | | 3点<br>作成未完件数20件未満 | | 0点<br>作成未完件数20件以上 | a | 5点 |
| 40 | CEI- 2 02 11 S | 検水魚の管理状況 | 管理状況や監視体制への支障から適切な管理度合を評価する。 | 管理状況 | 5点<br>適切に管理がなされ、監視体制に支障がなかった | | 3点<br>一部不適切な管理があったが、監視体制に支障がなかった。 | | 0点<br>不適切な管理により、監視体制に支障が生じた | a | 5点 |
| 41 | CEI- 2 03 01 S | 水質管理目標達成率 | 受託者が定めた水質管理自主目標値(残留塩素、PH)の達成率から取組みの姿勢と達成状況を評価する。 | (年間日数-目標値逸脱回数)/年間日数×100(%) | 15点<br>水質管理目標達成率95%以上 | 12点<br>水質管理目標達成率90%以上95%未満 | 9点<br>水質管理目標達成率85%以上90%未満 | 6点<br>水質管理目標達成率85%未満 | 0点<br>水質管理目標の確認を行わなかった。 | a | 15点 |
| 42 | CEI- 2 03 02 S | 薬品の在庫管理 | 厚田浄水場の次亜684kg、PAC738kg、苛性744kg、DPD試薬1箱、BTB試薬1本の常時保管規定量の遵守を評価する。 | 年間の常時保管規定量不足の発生回数(回)※不足の発生後補充までを1回とする | 5点<br>不足発生回数0回 | 4点<br>不足発生回数2回以内 | 3点<br>不足発生回数4回以内 | 2点<br>不足発生回数6回以内 | 1点<br>不足発生回数8回以内 | e | 1点 |
| 43 | CEI- 2 03 03 S | 水質計器のメンテナンス | 専門業者外注の連続水質計器を除いた卓上濁度計2台、PH計、残留塩素チェッカーのメンテナンス実施率について評価する。 | メンテナンス回数/計器総数4台×100(%) | 10点<br>メンテナンス実施率100%以上 | | 6点<br>メンテナンス実施率100% | | 2点<br>メンテナンス実施率100%未満 | a | 10点 |
| 44 | CEI- 3 01 01 S | 使用機材点検実施率 | 可搬式発電機、水中ポンプ、ホースなどの定期的な点検実施状況を評価する。 | 年間の点検実施回数(回) | 5点<br>年間点検実施回数2回以上 | | 3点<br>年間点検実施回数1回 | | 0点<br>年間点検実施回数0回 | c | 3点 |
| 45 | CEI- 3 01 03 | 作業による異常(断濁水、減水等)発生状況 | 弁きょう等点検、池状構造物点検清掃、取水施設点検清掃の操作の誤り等の作業による断水、濁水、減水などの発生状況により、作業の確実性や習熟度を評価する。 | 受託者の責に起因する異常発生件数(回) | 10点<br>作業による異常発生状況0回 | 8点<br>作業による異常発生状況、小規模なもの1回かつ、適正な処置により早期に解消ができた | 6点<br>作業による異常発生状況、小規模なもの2回以上かつ、適正な処置により早期に解消ができた | 4点<br>作業による異常発生状況、中規模なもの1回以上かつ、適正な処置により早期に解消ができた | 0点<br>作業による異常発生状況、大規模なもの1回以上もしくは適正な処置ができず影響が長期化した | a | 10点 |
| 46 | CEI- 3 01 04 | 施設損壊件数 | 各種施設点検・清掃、弁類等の操作や調査・修理による受託者の責による不適切な業務に起因する施設破損件数から技術力等を評価する。 | 受託者の責に起因する施設損壊件数(件) | 5点<br>施設損壊件数0件 | 4点<br>施設損壊件数1件かつ、適切な是正措置がとられ、運用に支障がなかった | 3点<br>施設損壊件数2件以上かつ、適切な是正措置がとられ、運用に支障がなかった | 2点<br>施設損壊件数1件以上かつ、運用に支障が生じた | 0点<br>施設損壊件数重大なもの1件以上もしくは適切な是正措置がとられなかった | a | 5点 |
| 47 | CEI- 3 03 01 | 弁室・弁きょう等点検清掃実施状況 | 実施状況を評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 5点<br>弁室・弁きょう等点検清掃実施状況100% | | 3点<br>弁室・弁きょう等点検清掃実施状況90%以上100%未満 | | 1点<br>弁室・弁きょう等点検清掃実施状況90%未満 | a | 5点 |
| 48 | CEI- 3 04 01 | 水管橋点検実施状況 | 水管橋点検実施状況を実施率から評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 10点<br>水管橋点検実施状況100% | 8点<br>水管橋点検実施状況95%以上100%未満 | 6点<br>水管橋点検実施状況90%以上95%未満 | 4点<br>水管橋点検実施状況80%以上90%未満 | 2点<br>水管橋点検実施状況80%未満 | a | 10点 |

別紙2

| No. | 大分類/中分類/小分類/独自項目 | 評価指標 | 評価内容 | 指標の定義等 | a | b | c | d | e | 評価結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CEI- 3 07 01 | 配水池等構造物点検実施状況 | 水道法施行規則第17の2によるコンクリート構造物の点検の実施状況を実施率により評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 5点<br>構造物定期点検実施率100% | 4点<br>構造物定期点検実施率95%以上100%未満 | 3点<br>構造物定期点検実施率90%以上95%未満 | 2点<br>構造物定期点検実施率80%以上90%未満 | 0点<br>構造物定期点検実施率80%未満 | a | 5点 |
| 50 | CEI- 3 08 01 | 取水施設点検実施状況 | 取水施設点検実施状況を実施率より評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 5点<br>取水施設点検実施率100% | | 3点<br>取水施設点検実施率90%以上100%未満 | | 1点<br>取水施設点検実施率90%未満 | a | 5点 |
| 51 | CEI- 3 15 01 | 取水施設清掃実施状況 | 取水施設清掃実施状況を実施率より評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 10点<br>取水施設清掃実施状況100% | 8点<br>取水施設清掃実施状況90%以上100%未満 | 6点<br>取水施設清掃実施状況85%以上90%未満 | 4点<br>取水施設清掃実施状況80%以上85%未満 | 2点<br>取水施設清掃実施状況80%未満 | a | 10点 |
| 52 | CEI- 3 16 01 | 池状構造物清掃実施状況 | 池状構造物清掃実施状況を実施率より評価する。 | 実施件数/計画件数×100(%) | 10点<br>池状構造物清掃実施状況100% | 8点<br>池状構造物清掃実施状況90%以上100%未満 | 6点<br>池状構造物清掃実施状況85%以上90%未満 | 4点<br>池状構造物清掃実施状況80%以上85%未満 | 2点<br>池状構造物清掃実施状況80%未満 | c | 6点 |
| 53 | CEI- 4 01 03 | 採水・検査業務の報告、連絡状況 | 採水・検査業務の報告、連絡状況について事務執行状況を履行率より評価する。 | 報告・連絡数/業務実施予定回数×100(%) | 5点<br>採水・検査業務の報告、連絡状況100%、内容に不備はなかった | 4点<br>採水・検査業務の報告、連絡状況100%、内容に不備があった | 3点<br>採水・検査業務の報告、連絡状況90%以上100%未満 | 2点<br>採水・検査業務の報告、連絡状況80%以上90%未満 | 1点<br>採水・検査業務の報告、連絡状況80%未満 | a | 5点 |
| 54 | CEI- 4 02 01 S | 法令に基づく水質検査実施状況 | 水質検査計画(法令)に基づく水質検査の実施について履行状況を実施率より評価する。 | 水質検査計画に基づく実施件数/必要件数×100(%) | 10点<br>法令に基づく水質検査実施状況100% | | | | 0点<br>法令に基づく水質検査実施状況100%未満 | a | 10点 |
| 55 | CEI- 4 02 09 | 独自検査の実施状況 | 水質検査計画に基づく以外の水質検査(独自検査)の実施について履行状況を実施率より評価する。 | 独自検査の実施状況実施件数/計画件数×100(%) | 10点<br>独自検査の実施状況100% | | 6点<br>独自検査の実施状況90%以上100%未満 | | 0点<br>独自検査の実施状況90%未満 | a | 10点 |
| 56 | CEI- 4 02 10 | 給水栓の水質確認状況 | 末端給水栓の水質確認状況について履行状況を実施率より評価する。 | 確認数(日数)/実施予定数(年日数)×100(%)※天候不良等不可抗力のものは除外する。 | 10点<br>給水栓の水質確認状況100% | | 6点<br>給水栓の水質確認状況90%以上100%未満 | | 0点<br>給水栓の水質確認状況90%未満 | a | 10点 |
| 57 | CEI- 4 03 02 | 浄水薬品の品質確認状況 | 浄水薬品の品質確認状況から薬品の管理能力や管理意識を評価する。 | 品質確認実施数/確認必要数×100(%) | 5点<br>浄水薬品の品質確認状況100% | | 3点<br>浄水薬品の品質確認状況95%以上100%未満 | | 0点<br>浄水薬品の品質確認状況95%未満 | a | 5点 |
| | | | | | | | | | 得点合計（400点満点） | | 372点 |

別紙－3

# 令　和　５　年　度

## 石狩市浄配水場運転管理等業務委託　運転管理業務評価要領

## 『業務改善提案評価』結果表

| 総合評価点『業務改善提案評価』 | |
|---|---|
| ５点　（10点満点） | 業務提案の内容は、各浄配水場施設を把握して提出されたものであり、採用した場合一定の成果が見込めると判断したものである。複数の提案があり、具体性や図示した資料等も含まれることから、評価点2点に加算点3点を加え、合計5点とする。 |

※提出された提案すべてを含めて評価し、評価点と評価の根拠を次頁に示す。

【業務改善提案評価基準】

| 評価基準 | 点数 |
|---|---|
| 水道施設課において提案内容を検討した結果、その内容が大変すぐれており、採用した場合、かなりの成果が見込めると判断した（着眼点、改善手法、効果など） | ４点 |
| 水道施設課において提案内容を検討した結果、その内容がすぐれており、採用した場合、成果が見込めると判断した（着眼点、改善手法、効果など） | ２点 |
| 水道施設課において、提案内容を検討した結果、目立った成果が得られるか疑問であると判断した | １点 |
| 業務改善提案がなかった | ０点 |

以下に示す提案があった場合は、それを評価し加算点を加える。

| | | |
|---|---|---|
| 業務提案加算点 | 乙から甲へ業務内容の改善を目的とした提案が複数提出されたときに、評価の点数に加算される点数 | 点数<br>２点以内 |
| | 改善に向けたより具体的な提案(概算費用や実施方法)が付加されたときに、評価の点数に加算される点数 | 点数<br>２点以内 |
| | 内容の図示、効果の可視化など、提案書類により工夫がなされたときに、評価の点数に加算される点数 | 点数<br>２点以内 |

別紙３

# 『　業務改善提案表　』

石狩市浄配水場等運転管理業務委託において、提出された業務改善の提案について、その内容を評価し点数化する。

| 提出年度 | 提案事項 | 提案内容（概略） | 提案採用の判断 | 提案採用判断の理由 | 提案事項実施予定 | 提案実施の効果 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6<br>① | 花川北配水場配水ポンプ１号ベアリング交換 | 弊社で実施した配水ポンプ１号の振動診断でポンプ本体の反電動機側のベアリングから擦切り音を確認いたしました。<br>当該施設は、主機配水ポンプが３台となり１日の配水量ピークの時間帯を除くと、平常時の運転台数は２台で問題はありません。また、メーカーへの聞き取りでベアリング交換については現場で可能な作業であることを確認しております。<br>当該ポンプにつきましては、基幹配水場の主要設備であるため予防保全の観点から修繕実施を提案いたします。 | 採用する | 当該施設は主要な設備であり、提案内容に基づき、早期での実施について検討してまいります。 | 令和７年度実施を検討 | 安定供給の向上 | ・複数提案<br>・具体提案 |
| ② | 花川北配水場管理棟屋根修繕 | 管理棟は建設から約３０年経過しており、屋根の鉄板に一部腐食と浸水の形跡がみられております。<br>現状のままで腐食が進むことにより、建屋躯体や設備等への影響が懸念されることから、腐食部分の補修及び屋根の鋼板補修等について提案いたします。 | 採用する | 提案のとおり老朽化が進んでいるものと判断します。令和７年度の予算措置を念頭に検討してまいります。 | 令和７年度予算化を検討 | 老朽化対策 | ・複数提案 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | 高岡配水場<br>消火用ポンプ<br>転用更新案について | 高岡配水場の消火用ポンプでケーシング内の一部に経年劣化による、さび等発生の兆候が見られます。その要因としては、当該設備が配水流量増加時のみしか稼働せず、停止時間が長いことが症状を発生しやすくしていると考えます。<br>石狩市水道施設更新計画において、近年には八幡配水場の設備更新が予定されているところと認識しております。それゆえに、同一機種である八幡配水場の配水ポンプと高岡配水場の消火用ポンプは、機械基礎や既設配管の寸法等に相違がなければ、八幡配水場の設備更新時に高岡配水場の消火ポンプとして転用が可能であると考えます。<br>これにより、経費削減かつ予備機の存在が故障時の復旧対応の大幅短縮と安定供給につながることから転用更新を提案いたします。 | 採用する | 提案内容は経済性、管理上の観点から有益なものと判断するため、提案を採用します。令和６年度履行の八幡配水場電気機械設備更新実施設計の業務内において、本提案の検証を行いました。 | 更新工事にあわせて実施 | 安定供給の向上 | ・複数加算<br>・具体提案 |
| ④ | 濃昼浄水場<br>ろ過池流入弁及び配水池通気筒修繕 | 濃昼浄水場は建設から 50 年が経過しており、随所に老朽化がみられる状況となりますが、日常及び定期点検により、状態判断と適宜修繕を行うことで維持管理を図っております。<br>これまでの点検業務で、弁体及び槽内配管に著しい腐食を確認しており、ろ過池流入弁及び配水池通気筒については、軽易な固着等の進行を確認しております。 | 採用する | 提案のとおり老朽化が進んでいるものと判断しております。より良い修繕方法も含め、さらなる詳細提案をいただきながら、今後の予算措置を念頭に検討してまいります。 | ろ過池流入弁を令和７年度予算化を検討し、通気筒は手法を含め検討 | 老朽化対策 | ・複数加算<br>・具体提案 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 修繕作業にあたり、水を抜いての槽内作業が必要となりますが、いずれも処理停止時の配水池容量内での施設運用が可能な見込みであることから修繕実施を提案いたします。 | | | | | |

# R5　評　価　結　果　表

受託者について
※平成23年～平成27年度まで**委託業者（株）ジャパンウォーター**
※平成28年～令和2年度まで**委託業者（株）ウォーターエージェンシー**
※令和3年度より**委託業者（株）ウォーターエージェンシー**

**令和4年5月に評価要領を改定（令和3年度評価より適用）**

結果表の「R2」（令和2年度分）は、改定前の要領にて評価した値を参考として記載している。総合評価は改定前後ともに100点満点ですが内容は異なります。

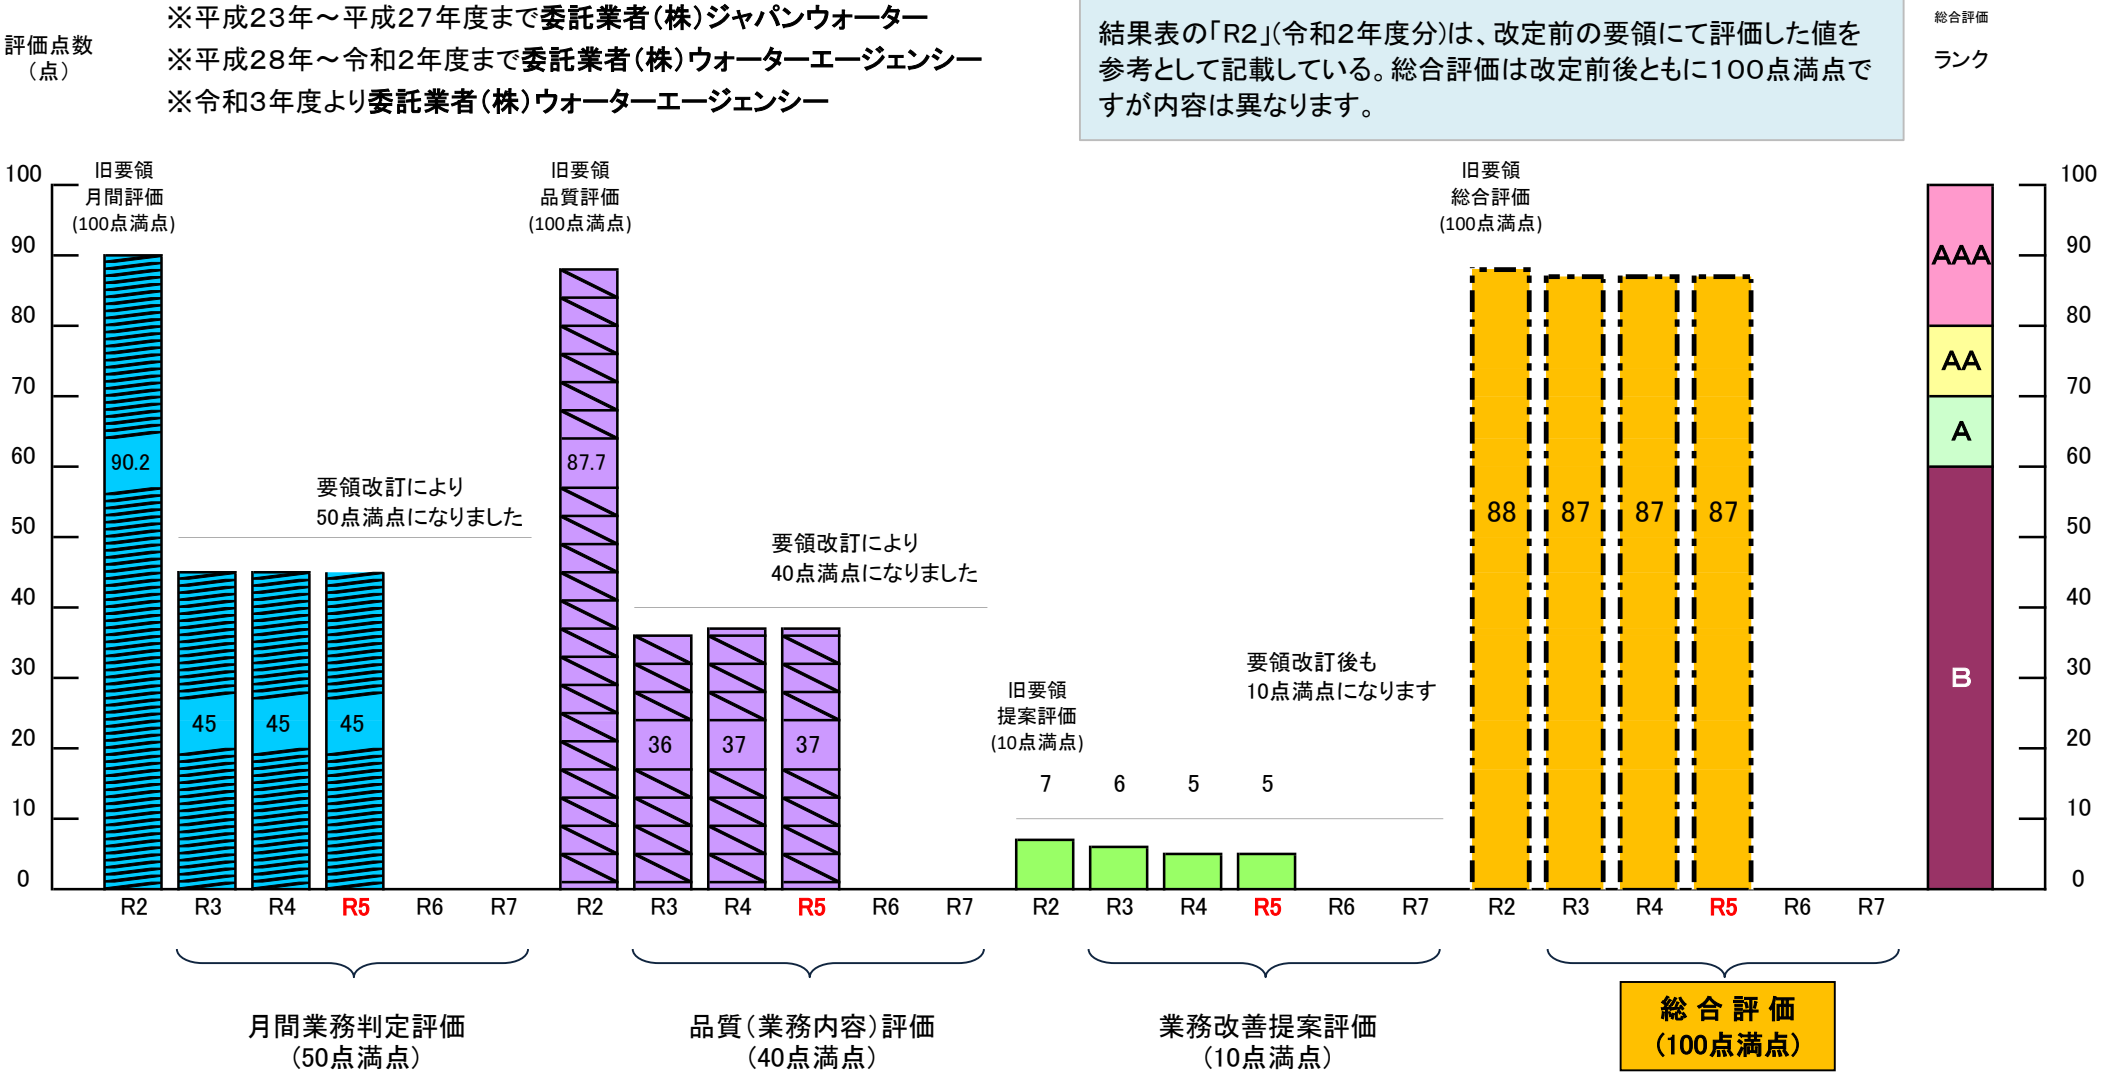


※「月間業務判定評価」、「品質（業務内容）評価」、「業務改善提案評価」の合計
